



**MUNICÍPIO da RIBEIRA BRAVA**  
**EDITAL**  
**212 / 2023**  
**CONDICIONAMENTO DO TRÂNSITO**  
**“INTERVENÇÃO NAS CÂMARAS DE PERDA DE CARGA”**  
**ESTRADA DA BANDA D’ALÉM**

**Rafael João Figueira Sousa**, Vereador do Município da Ribeira Brava com o pelouro do trânsito e prevenção rodoviária, torna público que a ARM, SA – Águas e Resíduos da Madeira, por motivos de realização de trabalhos de remodelação/substituição integral das câmaras de perdas no sistema de abastecimento de água, a **Estrada da Banda D’Além**, da freguesia e concelho da Ribeira Brava, ficará condicionada ao trânsito automóvel e pedonal, que se prevê iniciar a **21 de outubro de 2023 pelo prazo de 4 dias**.

Os trabalhos da empreitada serão executados pela empresa “AMYDRA - Construções, LDA.”, acompanhados e fiscalizados pela ARM.S.A. e pela “PROSPECTIVA - Projectos, Serviços, Estudos, S.A.”.

Agradecemos a vossa compreensão e pedimos desculpa pelos incómodos causados.

Ribeira Brava, 19 de Outubro de 2023

O Vereador\*,

(Rafael João Figueira Sousa (Sr.))

*Com competências delegadas e subdelegadas por despacho de 22 de Outubro 2021, publicado pelo Edital 282/2021*



## PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIO



LOTE 1 “Intervenções nas Câmaras de Perda de Carga com vista à redução de Perdas – Ilha da Madeira – Ribeira Brava e Câmara de Lobos” – Processo 06.0140



## PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA



**OBRA:** Lote 1 “Intervenções nas Câmaras de Perda de Carga com vista à redução de Perdas – Ilha da Madeira -Lote 1, Ribeira Brava e Câmara de Lobos” – Processo 06.0140

**DONO DE OBRA:** ARM – ÁGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.

**ENTIDADE EXECUTANTE:** AMYDRA CONSTRUÇÕES, LDA

2023

ELABORADO POR:  
Data: 30/ 09/ 2023

VALIDADO POR:  
Data:

APROVADO:  
Data:

# PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIO



LOTE 1 “Intervenções nas Câmaras de Perda de Carga com vista à redução de Perdas – Ilha da Madeira – Ribeira Brava e Câmara de Lobos” – Processo 06.0140



## CPC 10.21 → ESTRADA BANDA DE ALÉM – RIBEIRA BRAVA

A Entidade Executante AMYDRA Construções, Lda., vem por este comunicar a Vossas Exmas., que se encontra a preparar o arranque dos trabalhos de reabilitação de uma Câmara de Perda de Carga (CPC) da ARM (Águas e Resíduos da Madeira, S.A.) com vista à redução total de perdas de água.

Será necessário a execução de um By-Pass provisório em substituição da CPC existente, trabalhos de demolição de laje de cobertura, trabalhos de construção civil, tais como reabilitação de paredes, trabalhos de pintura e ligações finais à conduta existe, etc, por questões de segurança será necessário sinalizar a via para trabalhos à beira da Estrada para a execução de trabalhos de abertura/fecho de vala, reposição de pavimento provisório num arruamento Estrada Banda de Além, para a realização do By-Pass, concelho da Ribeira Brava.

Será necessário sinalizar a via a avisar a realização de trabalhos (ver anexo 2 – esquema de sinalização), e na via Secundária à Estrada da Banda de Além, na Estrada da Cruz da Banda de Além com informação de Início de Obras e Perigos Vários.

Face ao exposto solicita-se autorização a partir do dia 21 de Outubro de 2023 até 24 de Outubro de 2023, pelo prazo total de 4 dias de calendário. Para os trabalhos a realizar no referido troço, haverá 1 frente de trabalho, com auxílio de maquinaria ligeira (Gerador, Martelos eléctricos, Camião basculante de 3 m3, pequenas ferramentas elétricas, etc)

### **Frente de Trabalho - Condicionamento a peões na berma da estrada e sinalizar a via a avisar a realização de trabalhos:**

Extensão máxima de 3 ml de abertura/fecho de vala à beira da berma da estrada para eliminação de conduta de entrada e saída à CPC existente por motivos de recuperação, execução de by-pass provisório para continuação de abastecimento de água potável à população residente e reabilitação da Caixa de perda de carga (trabalhos já referenciados anteriormente).

- Prazo previsto: 4 dias de calendário;
- Data previsto de início: 21-10-2023
- Data previsto de fim: 24-10-2023
- Levantamento de Pavimentos em betuminoso;
- Abertura e fecho de vala em berma Municipal;

# PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIO



**LOTE 1 “Intervenções nas Câmaras de Perda de Carga com vista à redução de Perdas – Ilha da Madeira – Ribeira Brava e Câmara de Lobos” – Processo 06.0140**



- Lançamento de Conduta em PEAD DN 90 provisória e montagem de equipamentos hidráulicos (Válvulas em FFD, Filtro em FFD, Junta desmontagem em FFD, Redutora de Pressão, etc)
- Execução de By-Pass Provisório;
- Reposição de Pavimentos provisório em betonilha;
- Extensão total do troço, aproximadamente 3 metros;
- Etc.;

## **Anexos**

- Anexo 1 – Planta de Localização;
- Anexo 2 – Planta de Sinalização;



# PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIO

LOTE 1 “Intervenções nas Câmaras de Perda de Carga com vista à redução de Perdas – Ilha da Madeira – Ribeira Brava e Câmara de Lobos” – Processo 06.0140



## ANEXO 1 Planta de Localização

**OBRA:** "Intervenções nas Câmaras de Perda de Carga com vista à redução de Perdas – Ilha da Madeira – Lote 1 – Zona Oeste, Ribeira Brava e Câmara de Lobos" – Processo 06.0140

**amydra**  
SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

CPC 10.21 – ESTRADA BANDA DE ALÉM – RIBEIRA BRAVA

Anexo 1 → Planta de Localização



 Zona de Intervenção


# PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIO



LOTE 2 “Intervenções nas Câmaras de Perda de Carga com vista à  
redução de Perdas – Ilha da Madeira – MACHICO E SANTANA” –  
Processo 06.0140



## ANEXO 2 Planta de Sinalização

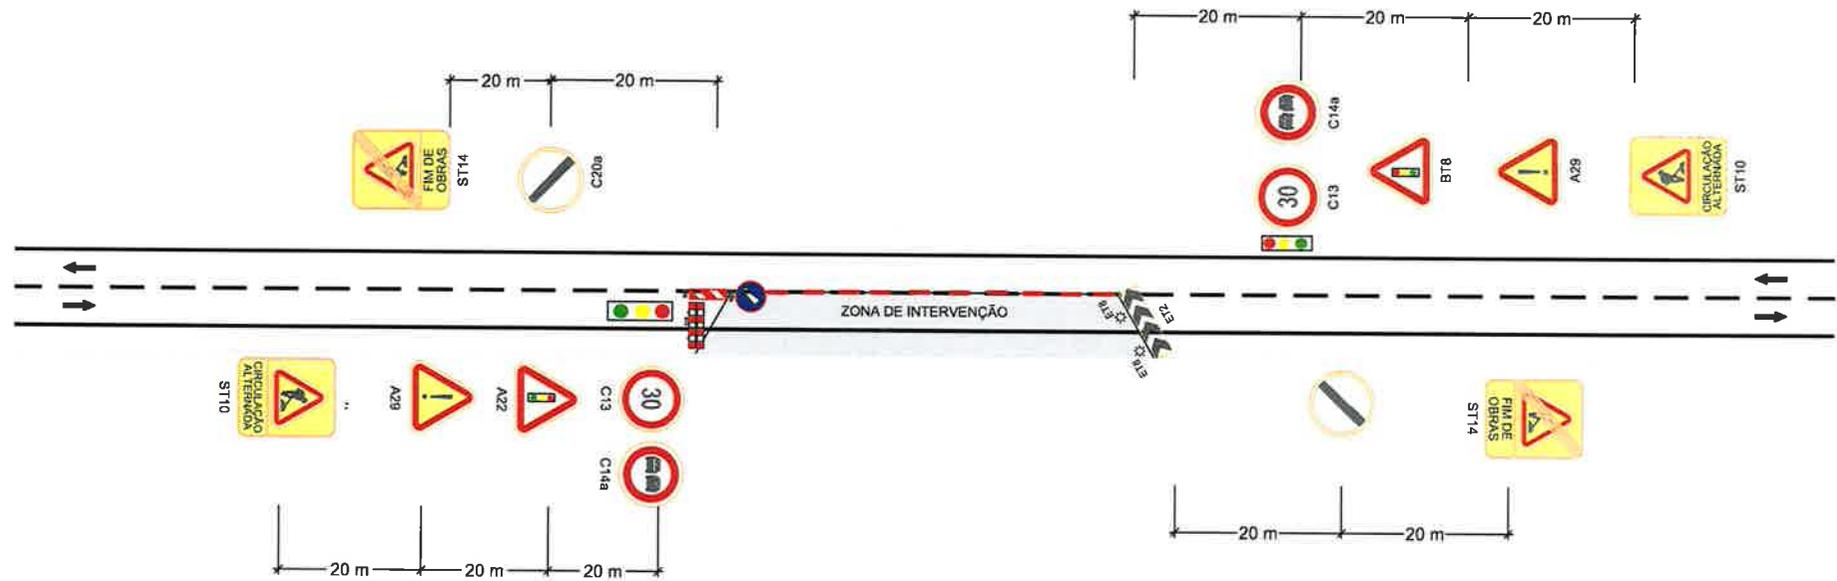

ALTERAÇÃO		DESIGNAÇÃO	DATA
alteração		designação	data
proj.		escala	data
des.		S/E	n° obra
verif.			n° desenho
aprov.			

**amydra**  
construções lda.

PLANTA DE SINALIZAÇÃO PARA  
TRABALHOS NA TOTALIDADE DA VIA  
COM SEMÁFOROS

